

우즈베키스탄 국별지원전략 및 지원사업 종합평가 관련 2차 현지조사

-김학기 연구위원(국제산업협력실) 외 2인

I. 개요

□ 출장지역: 우즈베키스탄 (타슈켄트)

□ 출장목적:

- KOICA 용역과제인 “우즈베키스탄 국별지원전략 및 지원사업 종합평가” 관련 조사 활동
- 현지 사업장 운영 현황 및 실태 조사
- 현지 운영 책임자 및 관계자 면담 조사, 설문 조사

□ 출장자:

- 산업연구원 국제산업협력실 연구위원 주동주
- 산업연구원 국제산업협력실 연구위원 김학기
- 산업연구원 국제산업협력실 전문위원 안옥윤

□ 출장기간: 2010. 9. 13~2010. 9. 18 (출입국일 포함)

□ 주요 일정 및 방문 기관

일 자	일정 및 방문 기관
9. 13(월)	<ul style="list-style-type: none"> - 13:15 인천 출발 - 16:50 타슈켄트 도착
9. 14(화)	<ul style="list-style-type: none"> - 09:30 우즈베키스탄 KOICA 사무소 방문, 사업 관련 협의 - 14:30 우즈베키스탄 KOTRA 사무소 방문 조사 - 16:30 우즈베키스탄 보건부 산하 KOICA 사업현장방문
9. 15(수)	<ul style="list-style-type: none"> - 09:00 우즈베키스탄 자연보호위원회 VODGEO 방문 조사 - 11:00 우즈베키스탄 노동사회보장부 방문 조사 - 14:30 우즈베키스탄 국가기록원 방문 조사 - 16:20 우즈베키스탄 정보통신부 방문 조사 - 18:00 우즈베키스탄 현지 컨설턴트와의 간담회 개최
9. 16(목)	<ul style="list-style-type: none"> - 10:30 우즈베키스탄 USAID 사무소 방문 조사 - 11:30 우즈베키스탄 JICA 사무소 방문 조사 - 14:30 우즈베키스탄 니자미사범대학교 방문 조사 - 16:00 우즈베키스탄 대외경제부 방문 조사
9. 17(금)	<ul style="list-style-type: none"> - 11:00 우즈베키스탄 KOICA 사무소 방문, wrap-up meeting - 21:00 타슈켄트 출발
9. 18(토)	<ul style="list-style-type: none"> - 07:15 인천 도착

Ⅱ. 방문 기관별 주요 활동 내용

□ 우즈베키스탄 주재 KOICA 사무소

○ 방문 일시: 9월 14일(화), 09시 30분

○ 참석자:

- 평가단 3인
- KOICA 駐우즈베키스탄 사무소 김동호 소장, 정영선 부소장
- KOICA 서울본부 차은주 과장

○ 주요 면담 내용:

- 조사 일정과 방문 예정 기관들에 대한 협의
- KOICA 우즈베키스탄 사업 내용 및 추진 관련 질문과 답변
- ODA 사업에 관한 우즈베키스탄측 입장
- 기타 우즈베키스탄의 ODA 사업 전반에 관한 내용 협의

[駐우즈베키스탄 KOICA 사무소 방문 협의]



□ 우즈베키스탄 KOTRA 사무소 방문

○ 방문 일시: 9월 14일(화), 14시 30분

○ 참석자:

- 駐우즈베키스탄 KOTRA 타슈켄트 이종섭 센터장
- 평가단 3인
- KOICA 서울본부 차은주 과장

○ 주요 면담 내용:

- 우즈베키스탄내 KOTRA 사업 개황
- KOICA 사업과 KOTRA 사업과의 조화 가능성
- ODA 사업과 기업수출전략 연계성에 대한 의견 청취

[駐우즈베키스탄 KOTRA 사무소 방문]



□ 우즈베키스탄 보건부 산하 KOICA 사업현장 방문

○ 평가대상 사업 개요

사업명	우즈베크 시행기관	한국 시행기관	사업규모	기간
전국 응급의료체계 구축역량 강화사업	보건부	KOICA	250만불	2007-2008

○ 방문 일시: 9월 14일(화), 16시 30분

○ 참석자:

- 우즈베키스탄 보건부 산하 타쉬켄트 Public Care 본부 수석의사 Dr. Saidazim S. Agzamkhodjayev 외 응급의료 담당의사단
- 평가단 3인
- KOICA 서울본부 차은주 과장

○ 주요 면담 내용:

- 타쉬켄트시 응급센터 본부를 방문한 결과 지원한 엠블런스가 매일 약 130회 응급 수송을 위해 출동하고 있으며, 노후화된 차량 교체로 환자를 안전하게 후송하는 역할을 충실히 수행하는 등 타쉬켄트 내 의료 응급 시스템 발전에 기여하고 있음을 확인
- 동 사업에 대한 만족도는 높은 편이며, 차량 전달식이 TV와 신문 등 대중매체를 통해 홍보됨에 따라 많은 사람들이 KOICA 사업임을 인식하고 있어 사업의 효과가 있는 것으로 평가
- 동 사업 당시 노후화된 차량 교체가 우선적으로 급해서 차량 내의 기본기기만 갖추어 받았으나 인공호흡기 등 차량 내 필요한 의료장비를 향후 좀 더 보완하기를 희망
- 타쉬켄트 내 응급차량 수가 총 138대에 달하는데 교체된 차량은 14대에 그쳐 향후 지속적으로 노후화된 차량을 교체하는 사업이 필요하다고 희망

[우즈베키스탄 보건부 산하 응급의료센터 방문]



□ 우즈베키스탄 자연보호위원회 VODGEO 방문

○ 평가대상 사업 개요

사업명	우즈벡 시행기관	한국 시행기관	사업규모	기간
농업배수 염분저감 기술개발사업	자연보호위원회	KOICA 한국환경공단	65만불	2009- 2010

○ 방문 일시: 9월 15일(수) 9시

○ 참여자:

- 우즈베키스탄 자연보호위원회 VODGEO의 Mr. Rahmatulla S. Khabirov 소장, Mr. Shukhrat M. Akhmedov 부소장 등
- 평가단 3인
- KOICA 서울본부 차은주 과장

○ 주요 면담 내용:

- 동 사업은 2010년 12월 완료될 예정이었으나 2분기에 도착 예정이었던 기자재 지원이 늦어져 금년 7월에 착수되어야 할 연구도 지연되었음. 따라서 금년 말까지 공동연구가 완료되지 못할 경우 2011년 6월까지 사업이 연장되어야 할 것으로 예상
- 동 사업의 연구결과에 대한 활용 계획은 아직 구체적으로 마련되어 있지 않으며, 실험결과에 따라 그 다음 단계를 구상할 예정임.
- 전문가 파견은 당초 계획상 공동실험 기간이 6개월로 되어 있었으나 2010. 9월 파견되었고 12월말까지 실험을 완료하려면 4개월 정도 시간 밖에 없어 우즈벡 여건 상 기간 안에 예정된 실험을 완료하기가 무리인 것으로 보이고, 기간 연장이 검토되어야 할 상황임

[우즈베키스탄 자연보호위원회 VODGEO 방문]



□ 우즈베키스탄 노동사회보장부 방문

○ 평가대상 사업 개요

사업명	우즈벡 시행기관	한국 시행기관	사업규모	기간
타슈켄트시 직업훈련원 건립	노동사회보장부	PMC: 한국산업인력공단 CM: 엠앤디 건축사사무소	400만불	2007-2011

○ 방문 일시: 2010년 9월 15일, 11시

○ 참석자:

- 우즈베키스탄 노동사회보장부 차관 사이도프 슈크라트, 정보담당국장 Mr. Ravshan R. Ibragimov
- 평가단 3인
- KOICA 서울본부 차은주 과장

○ 주요 면담 내용:

- 동 사업은 2011년 7월 정도 완료가 예상되며 당초 계획기간인 2009년 보다 많이 지연되고 있는 상황임. 설계 단계에서 발생한 양측 이견과 현지 행정담당자들의 추진력 결여가 사업 지연의 주된 사유로 판단됨.
- 우즈벡 담당자는 향후 건축관련 지원사업은 한국측에서 전부 담당하는 턱기 방식을 고려함이 좋을 것이라는 의견을 제시하기도 함.
- 향후 각 지방에도 동 사업과 같은 직업훈련센터 설립을 희망하며 장애인 재활센터 지원사업도 희망
- 노동부 직원의 연수 등 교육내용에 대한 만족도는 높은 편

[우즈베키스탄 노동사회보장부 방문]



□ 우즈베키스탄 국가기록원 방문

○ 평가대상 사업 개요

사업명	우즈벡 시행기관	한국 시행기관	사업규모	기간
3개 중앙자료보관소 정보화사업	국가기록원	-KOICA -삼성네트웍스	300만불	2008-2009

○ 방문 일시: 2010년 9월 15일, 14:30

○ 참석자:

- 우즈베키스탄 국가기록원 원장 Mr. Abdullaev Abdushukur, 부원장 Mr. Kucharova Dildora, 중앙자료보관소 소장 Mr. Ochilov Ilhom, Mr.Murodov Jurabek, 중앙영상기록물 보관소 소장 Mr. Ermatov Shuhrat
- 평가단 3인
- KOICA 서울본부 차은주 과장

○ 주요 면담 내용:

- 동 사업은 2010년 10월 완료하고 11월초에 개관할 예정이며 자료의 디지털화 작업은 현재 20% 진행 중
- 연수 교육 등으로 장비 운영에는 문제가 없는 것으로 평가
- 2009년 완료 예정이었으나 지연된 사유는 기존 설비 철거 등에 따른 건물개보수 작업 추가와 이에 따른 우즈벡 정부의 예산 지원이 2010년 2월에 이루어진 까닭임. 동 사업 담당자는 우즈벡 정부의 예산지원을 이끌어 낸 점을 높이 평가
- 매년 구 소련 소속 국가의 기록원 포럼이 개최되고 있는데 금년 5월에 개최된 포럼에서 동 사업에 대해 브리핑. 이에 따라 러시아를 비롯 참가한 많은 국가들이 동 사업에 관심을 갖는 등 우즈벡이 국제적으로 높이

평가받는 계기가 되어 한국 정부 및 KOICA 사업에 감사 표명

- 향후 7만권의 자료를 DB화하는 목표를 설정하고 있으나 예산 확보의 어려움을 표명
- 또한, 내년 11월까지 우즈벡 전체 100여개 기록물보관소간 네트워크를 추진할 예정

[우즈베키스탄 국가기록원 방문]



□ 우즈베키스탄 정보통신부 방문

○ 평가대상 사업 개요

사업명	우즈벡 시행기관	한국 시행기관	사업규모	기간
과학기술문헌 전자도서관 설립사업	정보통신부, 중앙도서정보센터	KOICA KCC 정보통신	200만불	2008-2009

○ 방문 일시: 2010년 9월 15일 16:20

○ 참석자:

- 우즈베키스탄 중앙도서정보센터 센터장 Mr. Ishmatov Alisher, 정보통신부 국제관계부 부장 Mr. Sanjar Alimov, software 생산부 부장 Mr. Rahmatullaev Zafar
- 평가단 3인
- KOICA 서울본부 차은주 과장

○ 주요 면담 내용:

- 동 사업은 현재 마무리 단계로 2010. 9. 23일 공식 개관하며 하루 200-300명 정도의 이용자가 있을 것으로 예상
- 주요 고객으로 인근에 위치한 정보통신대학교의 학생들 및 과학자들이 사용할 것으로 예상되며 사업의 영향력이 클 것으로 기대
- 정보통신부측은 동 사업을 모델로 향후 2011-2015년 간 약 1,000개의 유사 전자도서관을 우즈벡 전역에 설치하는 것을 계획 중
- 도서관 개관 지연은 KOICA측에서 전자자료 입력 등의 사유로 늦추어 줄 것을 요청하였기 때문이라고 함.
- 향후 e-book 사업 및 IT 전문가 교육에 관심 표명

[우즈베키스탄 정보통신부 방문]



□ 우즈베키스탄 현지 컨설턴트와의 간담회

○ 방문 일시: 2010년 9월 15일 18:00

○ 참석자:

- 평가단 3인
- 우즈베키스탄 주재 KOICA 사무소 정영선 부소장,
Mr. Burhonkhujayev Bahromjon
- 우즈베키스탄 현지 컨설턴트 Mr. Trushin

○ 주요 내용:

- 우즈베키스탄 국가 개발정책과 ODA 정책 방향 논의
- 우즈베키스탄 ODA 시스템 현황과 관련기관의 역할 파악
- 우즈베키스탄 주요 공여국의 현황과 특징 파악
- 한국의 ODA 사업 개선 방향 논의

□ 우즈베키스탄 주재 USAID 방문

○ 방문 일시: 2010. 9. 16(목), 10:30

○ 참석자:

- USAID 소장 John A. Pennell
- 평가단 3인
- KOICA 서울본부 차은주 과장

○ 주요 면담 내용:

- USAID에서는 현재 보건(HIV/AIDS 등 전염병관리), 민주주의 및 Rule of law, 농업분야에 중점적으로 사업을 추진 중
- 현재 농업분야는 5개의 농장(옛 집단농장) 대상 생산성 증대 사업을 추진중이나 향후 농산물의 상품화 및 시장접근성 확대 등 소득증대를 목표로 사업영역을 확대할 예정
- 중앙아시아는 현재 미국정부의 에너지자원 확보 및 아프간주둔 미국부대 군수물자보급로로서 중요한 지리적 요건을 갖고 있어USAID는 알마티에 지역사무소를 개설하여 동사무소에서 우즈베크를 포함한 중앙아시아 5개 국가에 대한 지역별 원조전략 수립 및 입찰 등을 추진
- 미국은 타 공여국과는 달리 우즈베크 외교부를 수원총괄기관으로 접촉하고 있음

□ 우즈베키스탄 주재 JICA 방문

○ 방문 일시: 2010년 9월 16일, 11:30


○ 참석자:

- JICA 소장 Mr. Ejiri Yukihiko, Mr. Naoki Nihei
- 평가단 3인
- KOICA 서울본부 차은주 과장

○ 주요 면담 내용:

- 일본은 대우즈벡 최대 공여국으로서 4개분야(인적자원개발, 농업, 사회개발, 인프라)를 중점적으로 지원 중
- 일본은 대외경제부를 수원총괄기관으로 접촉하고 있으며, 매년 8월경에 대외경제부에서 제출하는 수원희망 프로젝트 리스트를 고려하여 사업을 선정
- 일본의 차기 대우즈벡 지원전략(2011-2013)은 내년 3월경까지 수립 예정
- 향후 JICA의 전략지역인 아프리카 및 아프간 지역에 원조가 집중 투입됨에 따라 우즈벡에 대한 예산규모 축소가 불가피할 것으로 예상되며, 이 경우 중점분야를 인적자원개발 및 인프라 구축으로 집중할 예정
- 對우즈벡 물자 및 서비스는 모두 타이드되어 일본에서 입찰을 추진하고 있음을 확인

[우즈베키스탄 JICA 방문]

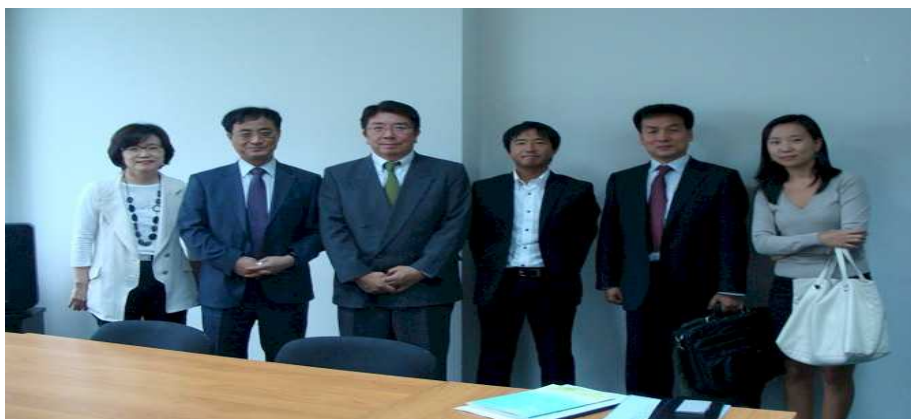

□ 우즈베키스탄 니자미사범대학교 방문 (봉사단 수혜자 면담)

○ 방문 일시: 2010년 9월 16일(목), 14:30

○ 참석자:

- Nizami 사범대 한국학센터 Dr. Bronislav S. Lee
- Nizami 사범대 한국어과 4학년 학생 5명
- 평가단 3인
- KOICA 서울본부 차은주 과장

○ 주요 면담 내용:

- 니자미 사범대 한국어봉사단원의 활동으로 한국어과 학생들의 한국어 실력 향상에 많이 기여하고 있음.
- 현재 우즈베크 국내 뿐 아니라 인근 카자흐스탄에 한국기업 및 합작기업의 증가로 한국어 구사자에 대한 인력 수요가 많은 편. 이에 따라 졸업생들의 취업률이 100%에 이르고 좋은 기업에 취업이 가능함을 밝힘.
- 한국어 학과의 봉사단 활용으로 원어민 교육이 가능하여 학과의 인지도 상승에도 영향을 미치고 있는 것으로 파악됨.
- 최근 교수로 활동하는 한국어봉사단원이 커리큘럼이 확정된 후 갑자기 중도귀국 함에 따라 학과운영에 어려움을 주는 사례가 발생. 따라서 봉사단 선발시 동 사례가 재발되지 않도록 요청
- 또한 한국문학 등 전문 강의가 필요하므로 봉사단 선발시 한국어(문학/어학) 석사 학위 소지자 파견을 희망

[우즈베키스탄 니자미사범대학교 방문]



□ 우즈베키스탄 대외경제부 방문

○ 방문 일시: 2010. 9. 16(목), 16:00

○ 참석자:

- 대외경제부 Bakhodir D. Alikhanov 아시아태평양국장
- 평가단 3인
- KOICA 서울본부 차은주 과장

○ 주요 면담 내용:

- 우즈베크 독립 후 한-우즈베크 관계가 전략적 파트너십으로 구축되었으며 성공적인 협력사업 추진 등으로 우호적인 관계를 유지
- 최근 연간 지원규모가 1,000만불 가량으로 확대되어 우즈베크의 주요 공여국으로 자리를 잡음
- 우즈베키스탄은 현재 수원총괄업무가 공여국 별로 나누어져 있는 상황. 대외경제부는 JICA와 KOICA를 담당하고, 외교부에서 USAID를 담당하며, EU는 재무부가 담당
- 또한 원조자금의 전반적인 입출 파악과 관리는 재무부의 “인도적 지원과 기술협력 조정과”에서 맡고 있으며, 각 부처들은 재무부측에 정례적으로 보고를 하도록 되어 있어 정부 차원에서 적극적으로 원조사업을 관리하고 있는 것으로 파악됨
- 우즈베크측은 기존 협력분야 외에 향후 협력 분야로 전력분야, 바이오 및 나노산업 등 High Tech 분야를 희망

[우즈베키스탄 대외경제부 방문]



□ 우즈베키스탄 주재 KOICA 사무소 (wrap-up meeting)

○ 방문 일시: 9월 17일(금), 11:00

○ 참석자:

- 평가단 3인
- 우즈베키스탄 주재 KOICA 사무소장 김동호, 부소장 정영선
- KOICA 서울본부 차은주 과장

○ 회의 주요 내용:

- 2차 현지조사 결과 정리
- 향후 CAS 방향 논의

Ⅲ. 2차 현지조사 종합의견

○ KOICA 사업에 대한 수원국 만족도는 대체로 매우 높은 편임

- 모든 방문기관에서 KOICA 사업에 대해 만족과 감사를 표시
- 지원 사업에 대한 자체관리도 철저하게 이루어지고 있는 것으로 평가

○ 수원국의 부처별 담당체계를 정확히 파악할 수 있었음.

- 우즈베키스탄에서는 공여국에 따라 부처별로 담당기관을 다음과 같이 분장하고 있는 것으로 파악됨.

- KOICA, JICA - 대외경제관계투자부
- USAID - 외교부
- EU - 재무부

- 단, 원조자금의 전반적인 입출 파악과 관리는 재무부의 “인도적 지원과 기술협력 조정과”에서 맡고 있음.

○ 수원국의 빈곤감소전략(PRSP)으로 시행되고 있는 “복지개선전략”(Welfare Improvement Strategy: WIS)의 실질적 의미를 파악할 수 있었음.

- 공여국을 상대로 한 대외적인 성격이 강한 문서로 파악됨.

○ 향후 CAS 방향

- KOICA 우즈베크 사무소측과 최종 정리회의에서 향후 CAS 방향에 대한 의견을 교환한 결과 다음과 같은 분야의 사업들이 향후 중점 사업으로 검토될 수 있을 것으로 보임

- 교육, 보건, 정보통신

- 농촌개발 (채소 등 시범농장, 묘종 이식 등)

- 아랄해 환경 문제 (직접적인 환경 문제보다 주변지역의 농촌 생활환경 개선 등)

- 산업정책 자문
